




Referenční list  
stavby číslo

**117021**



**I/16 křižovatka II/325 Chotěvice, oprava silnice**

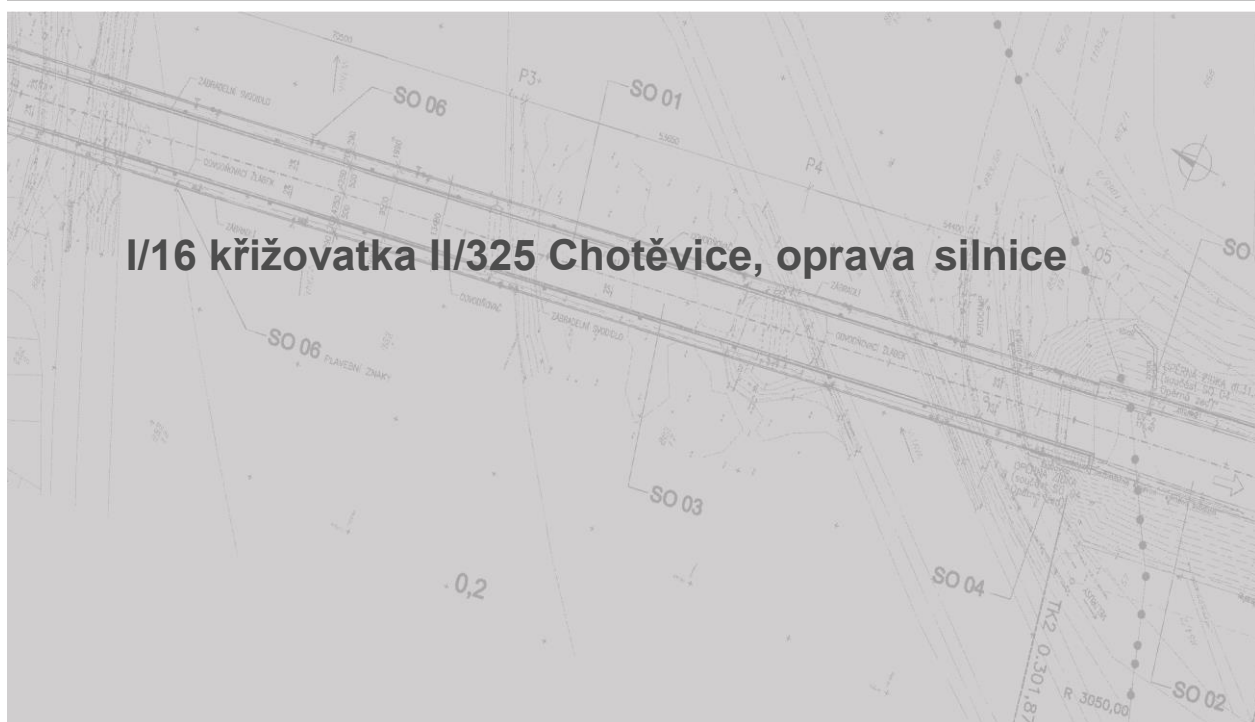

## POPIS STAVBY:

Celková oprava vozovky s výměnou nevyhovujících konstrukčních vrstev v celkové délce 1 566 m (obnova) a 1 395 m (rekonstrukce). Začátek úpravy je za přejezdem ČD na křižovatce se silnicí II/325 v Chotěvicích, staničení km 158,495, konec na křižovatce s komunikací III/32549.

Byla provedena oprava a výměna trubních propustků v km 2,090 a 2,687. Oprava vozovky byla realizována celkovou výměnou konstrukčních vrstev, sanace komunikace provedením pokládky asfaltových vrstev ACP 16+ tl. 60 mm, ACL 16+, 60 mm a obrusného krytu ACO 11+ 40 mm. Bylo obnoveno odvodnění, zřízeny nové krajnice, svislé a vodorovné dopravní značení.

Ve středu obce byl dle projektu výškově upraven a předlážděn chodník.



Investor	ŘSD ČR, Správa Hradec Králové
Kontaktní osoba investora	Miroslav Gregor (TDI)
Projektant	DIK Janák s.r.o. Trutnov, Ing. Stanislav Janák
Stavbyvedoucí	Bohumil Krátký
Místo plnění	Chotěvice
Doba plnění	VI/2017 – V/2018
Náklady na stavbu	29 953 568 Kč

Subdodavatelé:	Objem prací
